



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI CREMONA CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2024, n.24 /2024/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: ANTONIO BUCCARELLI

MAGISTRATO RELATORE: MAURA CARTA

Hanno collaborato

Giulia Milani

Giuseppe Pro

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario

nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTA la deliberazione SRCLOM/253/2022/GEST sulla ricognizione dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Cremona;

VISTA la deliberazione SRCLOM/40/2023/INPR con cui la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione SRCLOM/173/2023/INPR di rimodulazione dell'attività di controllo programmata per il 2023;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.16/2023/FRG del 27/10/2023 "Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite SSRRCO/34/2023/REF "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel primo semestre 2023, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77";

VISTA la nota del 17 aprile 2023, con la quale il Comune di Cremona ha risposto alla richiesta istruttoria inviata dalla Sezione in data 21 marzo 2023;

VISTA l'ulteriore nota del 23 novembre 2023, con la quale il Comune di Cremona ha risposto alla nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 3 novembre 2023;

VISTA l'ordinanza n. 24 del 15 del gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

VISTA la nota prot. prot. 725 del 17 gennaio 2024, con la quale il Comune di Cremona ha trasmesso l'atto di ricognizione dei progetti non nativi PNRR e relativa documentazione, a supporto del precedente riscontro istruttorio;

UDITO il relatore, dott.ssa Maura Carta

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di Cremona, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021 n. 77".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune del Comune di Cremona.

La presente deliberazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il Comune dovrà dare riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Relatore

(dott.ssa Maura Carta)



MAURA TINA
PASQUA CARTA
CORTE DEI CONTI
30.01.2024
08:52:28
GMT+01:00

Il Presidente

(dott. Antonio Buccarelli)



ANTONIO
BUCCARELLI
CORTE DEI
CONTI
30.01.2024
00:21:35
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il
30 gennaio 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)



SUSANNA PAOLA
DE BERNARDIS
CORTE DEI CONTI
30.01.2024
12:04:18
GMT+02:00

INDICE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	9
2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	11
2.1 Avanzamento procedurale.....	15
2.2 Avanzamento finanziario.....	21
2.3 Effetti della rimodulazione	25
3. GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR	30
4. SITUAZIONE DEL PERSONALE.....	31
4.1 Esperti della Regione	31
4.2. Assunzioni di personale a tempo determinato	33
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE	35

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti PNRR suddivisi per missione e per tipologia.....	12
Tabella 2-Importo dei Progetti PNRR.....	13
Tabella 3- Avanzamento procedurale.....	17
Tabella 4- Stato attuazione progetti - monitoraggio preventivo 2023-2025	20
Tabella 5 - Risorse accertate in bilancio e pagamenti	22
Tabella 6 - Anticipazioni per missioni	22
Tabella 7-Progetti oggetto di possibile definanziamento	26
Tabella 8-Stato di attuazione dei progetti oggetto di possibile definanziamento.....	27
Tabella 9- Elenco dettagliato dei progetti del Comune di Cremona.....	38

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1: Finanziamento PNRR per progetto nelle missioni.....	14
Grafico 2- Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR	15
Grafico 3- Stato di attuazione procedurale	16
Grafico 4 - Stato di attuazione finanziaria (Pagamenti su fondi accertati in bilancio) .	23
Grafico 5- Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento..	28

ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI CREMONA
CONTROLLO SULLA GESTIONE
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Sezione regionale di controllo della Lombardia, proseguendo la ricognizione avviata nel corso del 2022 sui progetti del PNRR di cui il Comune di Cremona è “soggetto attuatore” – delibera n. 253/2022/GEST – ne limita l’attività al solo controllo sulla gestione in ragione della sopravvenuta normativa.

La Sezione Lombardia ha rimodulato la programmazione dell’attività di controllo dopo l’entrata in vigore dall’art. 1, comma 12 quinquies, del d. l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito nella legge 21 giugno 2023 n. 74, che ha modificato l’art. 22 del d. l. n. 76/2020 sul *controllo concomitante*, escludendone l’applicazione per i piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Stante la modifica normativa è stato previsto, con riferimento ai progetti che avevano formato oggetto di ricognizione nel 2022, che sarebbe stato effettuato soltanto il “controllo sulla gestione” ai sensi dall’art. 7 del d. l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 (cfr. SRC Lombardia n.173/2023/INPR).

La deliberazione di rimodulazione richiama il criterio elaborato, in sede nomofilattica, dalle Sezione delle Autonomie “ *la quale, nel ritenere che “i controlli sulla gestione non possono attendere l’esito conclusivo delle attività che, nella maggior parte dei casi, è molto protratto nel tempo” si è espressa nel senso che detti controlli devono “focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi intermedi” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR)”* (così del. 173 cit.).

In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale la valutazione gestionale della Corte, a fronte di interventi che nella maggior parte dei casi dovrebbero giungere a completamento entro il 2026 si concentra sul raggiungimento dei *risultati intermedi e sulla progressione dei relativi procedimenti amministrativi* da parte dei soggetti attuatori.

Il controllo sulla gestione, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del d.l. n. 77/2021 e s.m.i. e dall’art. 3 della l. n. 20/1994, viene svolto “*anche in corso di esercizio*”, effettuando “*valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego*” delle

relative risorse, verificando *“la legittimità e la regolarità”* del loro utilizzo ed accertando *“la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge”*.

*

Si ritiene utile rammentare in questo sintetico inquadramento normativo, che la Sezione delle Autonomie nel fornire indicazioni sul *“Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”* (II semestre 2023) si è soffermata sulle finalità del controllo di gestione sui progetti del PNRR e PNC, evidenziando che *“Nella legislazione dedicata al PNRR e in particolare, all’art 1, co. 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene fatto riferimento alla responsabilità delle Amministrazioni e degli organismi titolari dei progetti finanziati per l’attuazione del programma Next Generation EU «conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali»*. Inoltre, il Documento della Commissione Europea *“Commission Staff Working Document Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans”* (SWD-2020 205 final) fa esplicito riferimento a tale profilo, individuando con la locuzione *“sound financial management”*, il concetto di *“sana gestione finanziaria”*, che ricade nel perimetro di controllo che la Corte dei conti è chiamata a garantire. *L’esigenza di un’oculata programmazione e gestione della spesa è fondamentale nell’ottica di preservare la sana gestione finanziaria dell’ente.”* (cfr. Sez. Aut. deliberazione n.16/2023/FRG).

*

In tale contesto si inserisce la presente deliberazione circoscritta al controllo sulla gestione nella fase di attuazione, finanziaria e procedurale degli interventi di cui il Comune di Cremona è soggetto attuatore e/o beneficiario.

2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Sezione nel mese di marzo 2023 ha avviato un'attività istruttoria nei confronti del Comune di Cremona, integrata nel mese di novembre 2023, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti del PNRR.

Sono stati presi in esame tutti gli interventi gestiti direttamente dal Comune di Cremona in qualità di "soggetto attuatore", ovvero gli interventi con una ricaduta finanziaria effettiva sul bilancio del Comune, quale ente direttamente beneficiario dei finanziamenti stanziati dal PNRR e la cui gestione è sotto il diretto controllo del Comune o di enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei progetti e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente (es. in materia di appalti pubblici).¹

Giova ricordare che gli enti locali sono *soggetti attuatori* qualora provvedano direttamente alla realizzazione degli interventi, oppure *soggetti beneficiari* quando si avvalgono di enti strumentali o di altri soggetti, anche privati, per l'esecuzione del progetto.

Il citato d.l. n. 77/2021 all'art. 10, comma 1, consente, infatti, agli enti locali titolari di fondi del PNRR di affidare le risorse di cui sono beneficiari ad altri soggetti che attuino materialmente gli interventi, tra cui società partecipate *in-house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti. In questo caso l'amministrazione è tenuta a stipulare una convenzione con l'ente strumentale, che ne specifichi il ruolo, la responsabilità e la remunerazione.²

Sono esclusi dalla presente analisi gli interventi che, pur avendo una ricaduta sul territorio del Comune, esulano dal perimetro di bilancio dell'Ente.

¹ L'art.9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (in breve d.l. n. 77/2021) stabilisce che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente."

² Il beneficiario, anche laddove non figuri come soggetto attuatore, è tenuto a monitorare lo stato di attuazione o dalla rendicontazione delle risorse, che transitano dal bilancio dell'ente. Nel momento del riparto delle risorse, viene infatti siglata una convenzione tra ministero e beneficiario, che stabilisce in dettaglio gli obblighi, tra cui quello di garantire l'attuazione del progetto nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e la conservazione di tutta la documentazione contabile allo scopo di garantire la corretta rendicontazione.

*

La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di cui il Comune di Cremona è soggetto attuatore è stata condotta sulla base degli esiti dell'attività istruttoria effettuata nel corso del 2023 integrata dagli elementi conoscitivi della piattaforma ReGiS.³

Nel dettaglio, gli interventi di cui il Comune di Cremona è soggetto attuatore sono aggregati per Missione e rappresentati nella seguente tabella.

Tabella 1 - Progetti PNRR suddivisi per missione e per tipologia

Missioni	n. CUP	% CUP sul totale
M1 Digitalizzazione della PA	7	13%
M2 Mobilità sostenibile e tutela del territorio	18	34%
M4 Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido	3	6%
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	25	47%
Totale complessivo	53	100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Si precisa che:

- nella risposta istruttoria il Comune indica, per taluni CUP, importi di progetto diversi da quelli caricati sulla piattaforma ReGiS. Per esigenze di uniformità di indagine, si è scelto di effettuare l'esame valorizzando i dati presenti nella piattaforma ministeriale. Si evidenziano, in ogni caso, le discrasie segnalate dal Comune nella tabella 7 (in calce alla relazione) dove sono elencati tutti i 53 progetti.
- il monitoraggio include il CUP D11F22001710006 (PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3."ADOZIONE APP IO" per

³ Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che "I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza." Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

30.576,00 euro) che, seppur cancellato da ReGiS, è ugualmente stato oggetto di istruttoria;

I 53 progetti dei quali il Comune di Cremona è soggetto attuatore/beneficiario sono identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP): tra questi, 7 progetti si trovano nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA), 18 si trovano nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), 3 nella Missione 4 (Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido) e 25 nella Missione 5 (Inclusione e coesione).

Nella tabella che segue si rappresenta l'importo totale dei progetti, aggregati per Missione, con indicazione della quota di finanziamento mediante fondi PNRR.

Tabella 2-Importo dei Progetti PNRR

Missione	RRF -(PNRR) (A)	FOI	Altro pubblico	FPCOM- Fondi Propri dei Comuni	Importo totale del progetto (B)	% PNRR sul totale Progetto (A/B)	% PNRR sulla missione (A/Totale della missione)
M1	1.078.309,00 €	-	-	-	1.078.309,00 €	100%	2%
M2	15.230.285,23 €	-	216.239,71 €	50.100,48 €	15.496.625,42 €	98%	29%
M4	5.133.113,80 €	1.246.581,30 €	-	2.416.979,64 €	8.796.674,74 €	58%	10%
M5	30.221.996,01 €	2.926.705,24 €	298.291,13 €	1.422.843,82 €	34.869.836,20 €	87%	58%
Totale complessivo	51.663.704,04 €	4.173.286,54 €	514.530,84 €	3.889.923,94 €	60.241.445,36 €	86%	100%
% sul totale	86%	7%	1%	6%	100%	-	-


Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Il Comune di Cremona risulta essere soggetto attuatore per un ammontare complessivo di fondi del PNRR pari a 51.663.703,42 euro.

La Missione 1 risulta interamente finanziata da fondi PNRR, la Missione 2 per il 98 per cento la missione 4 per il 58 per cento mentre la Missione 5 per l'87 per cento.


Quest'ultima Missione accentra, inoltre, il 58 per cento dei fondi complessivi di cui il Comune di Cremona risulta titolare in quanto soggetto attuatore, nonché il numero maggiore di progetti, pari al 47 per cento dei CUP (25 di 53 totali).

Grafico 1: Finanziamento PNRR per progetto nelle missioni

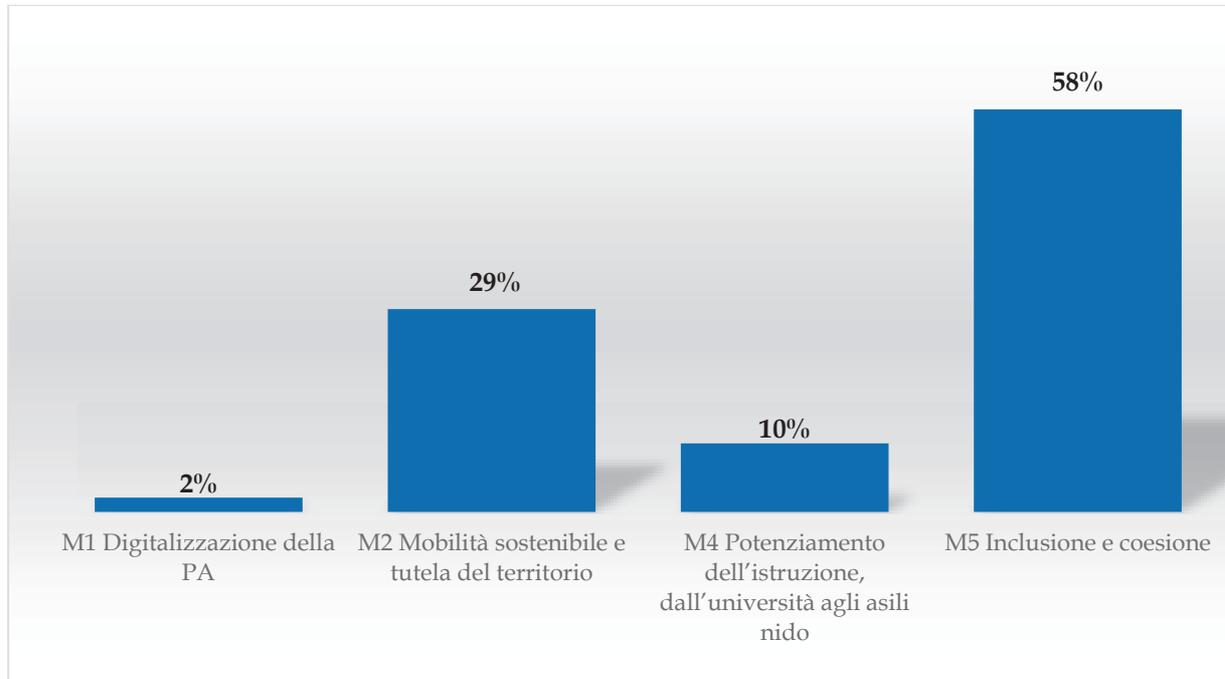

La Sezione ha potuto accertare che le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono all'86 per cento del totale; il resto delle risorse proviene dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) per il 7 per cento, dai fondi propri dell'Ente per circa 6 per cento mentre rimangono residuali pari all'1 per cento gli altri fondi pubblici.

Grafico 2- Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR

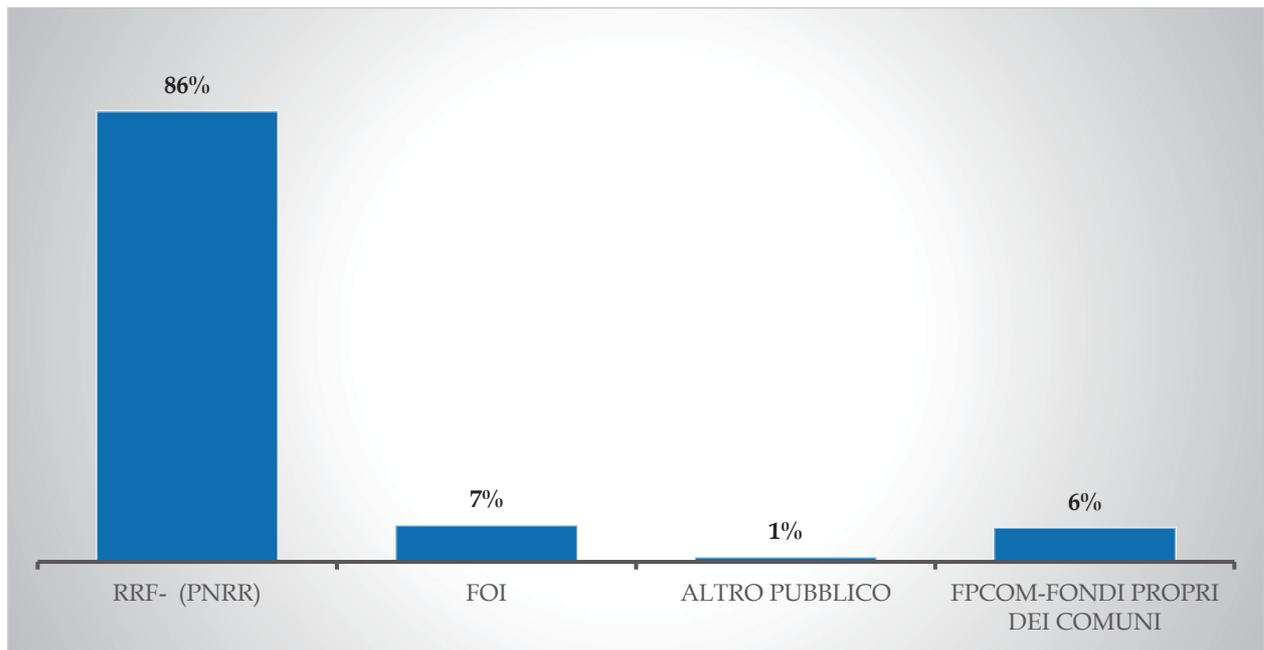

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla tabella generale (in calce alla relazione) dove sono riportate in modo dettagliato le informazioni riguardanti i 53 progetti.

*

2.1 Avanzamento procedurale

All'interno della piattaforma ReGiS -ove correttamente implementata- è possibile verificare e monitorare l'avanzamento procedurale mediante l'associazione nel tempo ad ogni singolo CUP di una specifica fase della sequenza dei procedimenti amministrativi.

Le possibili fasi dell'attuazione sono così definite: "Progettazione esecutiva", "Pubblicazione bando di gara", "Aggiudicazione", "Stipula contratto", "Esecuzione lavori o Esecuzione fornitura", "Collaudo".

*

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma predefinito a livello nazionale.

Questo implica che i diversi progetti si sviluppino nel rispetto della sequenza temporale all'interno della quale ciascuna fase dell'intervento deve essere completata.


A tale proposito si osserva che, mentre il decreto del MEF del 6 agosto 2021 (“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per il PNRR – DM ripartizione traguardi e obiettivi”) definisce la data con cui gli interventi devono essere conclusi, gli accordi operativi (“Operational Arrangements”)⁴ stabiliscono le scadenze delle fasi di ciascun intervento del piano.

Fatta questa premessa di ordine generale, con riguardo al Comune in esame va precisato che, dopo aver estratto i dati da ReGiS, è stata formulata una richiesta istruttoria, a cui l’Ente ha dato riscontro (in data 24 novembre 2023 prot. CdC n. 25103), per acquisire aggiornamenti rispetto alle informazioni contenute sulla piattaforma.

La Sezione sulla base del riscontro ha, dunque, potuto accertare la fase procedurale di ogni singolo progetto del PNRR del Comune di Cremona.

Il grafico seguente fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.

Grafico 3- Stato di attuazione procedurale

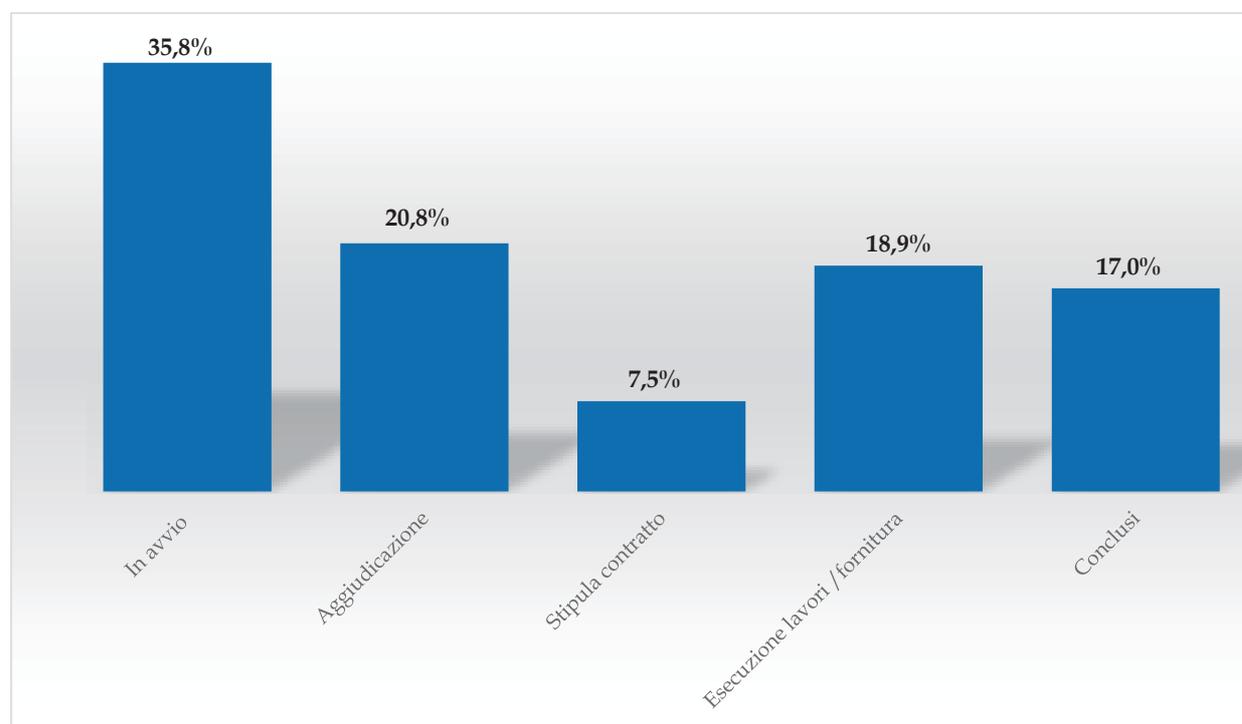

⁴ Si tratta degli accordi che l’Italia ha condiviso con la Commissione Europea (firmati dal Ministro Franco il 23-12-2021):https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf

L'attività di conversione delle fasi si è rivelata estremamente complessa e richiede una precisazione di metodo.

Si è proceduto al controllo di gestione seguendo i seguenti criteri:

- tutti i CUP in stato “concluso” su ReGiS sono indicati nella presente relazione come tali;
- in assenza di specificazione da parte dell’Ente, è stata valorizzata la fase dell’ultimo documento caricato in ReGiS;
- in assenza totale di dati caricati in ReGiS e di informazioni da parte dell’Ente, la fase è indicata come in “avvio”. A tale proposito va osservato che spesso le note trasmesse dell’Ente non consentono di individuare con chiarezza la fase in cui la procedura si trova.

Per tali motivi, a seguito dell’elaborazione dei dati, la percentuale maggiore di CUP risulta in avvio, con l’avvertenza che tale dato potrebbe risultare non rispondente al reale avanzamento procedurale e riservando la verifica ai successivi approfondimenti.

Il grafico mostra come una quota pari al 36 per cento dei progetti sia in fase di avvio; il 21 per cento dei progetti risulta nella fase di aggiudicazione lavori mentre l’8 per cento ha concluso la fase di stipula del contratto. Il 19 per cento dei progetti dell’Ente risulta nella fase di esecuzione, mentre il rimanente 17 per cento è giunto alla conclusione.

La tabella seguente riporta lo stato di avanzamento delle procedure e rappresenta una situazione eterogenea tra le diverse missioni.

Tabella 3- Avanzamento procedurale

Missioni	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuzione lavori / fornitura	Conclusi	Totale complessivo
M1	3	1	1	2		7
M2	2	2		5	9	18
M4		1		2		3
M5	14	7	3	1		25
Totale complessivo	19	11	4	10	9	53

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Nel dettaglio, si osserva che dei sette CUP rientranti nella Missione 1, ben tre sono ancora in fase di avvio mentre per due è iniziata l'esecuzione; i restanti sono in fase di aggiudicazione e stipula del contratto.

Riguardo la Missione 2, la metà dei CUP, pari a nove, sono conclusi e cinque sono nella fase di esecuzione; i restanti sono in fase di avvio e aggiudicazione.

La Missione 5 presenta più della metà dei CUP (14 su 25), ancora in fase di avvio; solo sette sono stati aggiudicati, tre risultano in fase di stipula del contratto e uno è in fase di esecuzione.

Per il dettaglio circa lo stato di avanzamento procedurale di ogni singolo progetto si rimanda alla tabella generale in calce alla relazione.

*

Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma (al 30 giugno 2023) i revisori dell'Ente hanno reso la Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2023-2025, redatto in conformità alle Linee Guida della Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR.

La tabella presenta il monitoraggio di soli 51 CUP, sui 53 oggetto di istruttoria; di questi solo 49 CUP sono in comune⁵.

I seguenti CUP (oggetto di istruttoria) non sono, dunque, inclusi nel prospetto redatto dall'Organo di revisione e, in particolare:

- D14D23000880006 - *Efficientamento energetico edifici scolastici per 170.000,00 €;*
- D14D23000890006 - *Efficientamento energetici per 170.000,00 €;*
- D10J20000040008 - *Comune di Cremona LV per 6.230.086,33 €;*
- D15F22000930001 - *Sottopasso di via Bergamo*via Bergamo*interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo per 1.010.000,00 €.*

Per tali CUP, pertanto, non sono disponibili informazioni circa il rispetto del cronoprogramma di attuazione degli interventi, per cui si rinvia alla successiva verifica.

⁵ Il file, include, inoltre 1 CUP non ammesso a finanziamento e 1 CUP cancellato.

Quanto, invece, ai 49 CUP monitorati dai Revisori si riscontra una percentuale pari al 98 per cento dei progetti allineati coi tempi rispetto al cronoprogramma (ovvero 48 su 49) al 30 giugno 2023.

Per un unico progetto, di seguito indicato, non sono dichiarate le date di “fine prevista” e “fine effettiva” delle attività, non risultando conseguentemente possibile determinare il rispetto del cronoprogramma:

- M2C1 (Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare) - I1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti) – CUP D19J22000560001 “Cremona smart waste: misurazione innovativa dei rifiuti urbani per la tariffa puntuale*territorio comunale*acquisto di forniture per sviluppare la misurazione innovativa dei rifiuti urbani per la tariffa puntuale” per un totale di 1.140.575,31 € (di cui finanziamenti PNRR di 1.000.000,00 €).

In sede istruttoria è stato, in ogni caso, possibile verificare, rispetto a tutti e 5 i CUP per i quali l’Organo di Revisione non ha fornito informazioni, lo stato di attuazione, come rappresentato nella tabella che segue:

Tabella 4- Stato attuazione progetti - monitoraggio preventivo 2023-2025

INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO O REGIS	PNRR REGIS	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D14D23000880006	Efficientamento energetico edifici scolastici	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	19.458,10 €	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. Importo complessivo speso 19.458,10 euro, da aggiornare in ReGiS.
M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D14D23000890006	Efficientamento energetico	170.000,00 €	170.000,00 €	-€	-€	Efficientamento energetico edifici scolastici nidi e materne- ANNO 2023. DD di approvazione/validazione progetto e affidamento lavori n. 1498/2023 del 06/09/23. Consegna lavori avvenuta entro il 15/09/23, in attesa fornitura materiale. Termini da decreto di finanziamento: consegna lavori entro il 15/09/23 e fine lavori entro il 31/12/2024. importo complessivo corretto .
M2C2I4.4.1 Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	D10J20000040008	Comune di Cremona LV	6.230.086,33 €	6.230.086,33 €	6.230.086,00 €	1.246.017,20 €	ACQUISTO BUS E INFRASTRUTTURE DI RICARICA (PSNMS) -Aggiudicazione provvisoria prot. 6962 del 16/11/2023. Termini da bando: aggiudicazione contratto attuativo entro 31/12/23, consegna entro 31/12/25. Importo complessivo 6.230.373, da aggiornare in ReGiS. 64 euro.
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	D19J22000560001	Cremona smart waste: misurazione innovativa dei rifiuti urbani per la tariffa puntuale	1.140.575,31 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	-€	Accoglimento della richiesta di modifica cronoprogramma con P.G. n. 89114/2023 del Comune di Cremona; ultimo atto adottato: Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 31 ottobre 20123 avente per oggetto "PNRR M2C11/1.1 - Finanziamento dell'Unione Europea - Next Generation EU - CUO D19J22000560001 Progetto "CREMONA SMART WASE. MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE" - Modifica cronoprogramma
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D15F22000930001	SOTTOPASSO DI VIA BERGAMO*VIA BERGAMO*INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA BERGAMO	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €	-€	In fase di ricerca del professionista a cui affidare la progettazione esecutiva. Importo complessivo corretto. Da Decreto di assegnazione termine per aggiudicazione entro il 21/10/24 , 30/09/25 per liquidazione di almeno il 30% delle opere, CRE entro il 31/03/26. Erogazioni tranche contribuito: 20% acconto, 70% sulla base della rendicontazione trasmessa e 10% saldo.

2.2 Avanzamento finanziario

La Sezione in sede istruttoria (nota prot. 24209 del 3 novembre 2023) ha chiesto al Comune di Cremona *“di indicare l'importo accertato in bilancio, a seguito del trasferimento di risorse da Regione o Amministrazione centrale, specificando il totale dei pagamenti effettuati dall'Ente”* per ciascun progetto identificato mediante CUP.

A tale richiesta l'Ente ha dato riscontro trasmettendo informazioni relative allo stato di avanzamento finanziario di ciascun progetto, in particolare relativamente alle risorse complessive accertate in bilancio per l'avvio dei progetti, ovvero provenienti dai trasferimenti statali o regionali.

Si rammenta che l'art. 15, comma 4 del d.l. 77/2021 con finalità acceleratoria ha previsto che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono loro attribuite dal PNRR su specifici capitoli di spesa, già dalla data del decreto o atto di riparto *“senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti”*.

Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l'accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa.

Inoltre, poiché nel PNRR l'avvio dei progetti precede l'erogazione del finanziamento, per gli enti che non abbiano capienza finanziaria sufficiente per avviare gli investimenti, il decreto-legge n. 152 del 2021 *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, ha previsto all'art. 9, commi 6 e 7, la possibilità di disporre di anticipi di liquidità (nella misura del 10 per cento delle risorse complessive assegnate) su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR.⁶

⁶ La modalità di contabilizzazione delle anticipazioni è disciplinata dal comma 6 dello stesso decreto, *“per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR”*.

Le informazioni sull'avanzamento finanziario vengono riassunte in forma aggregata per Missione nella seguente tabella.

Tabella 5 - Risorse accertate in bilancio e pagamenti

Missioni	n. CUP	Importo finanziato dal PNRR	Accertamenti (€)	Pagamenti (€)	Pagamenti su accertamenti %
M1	7	1.078.309,00 €	1.078.385,00 €	364.562,03 €	34%
M2	18	15.230.285,23 €	9.763.764,41 €	2.565.300,54 €	26%
M4	3	5.133.113,80 €	6.379.695,10 €	1.480.973,80 €	23%
M5	25	30.221.995,39 €	27.516.836,90 €	796.767,00 €	3%
Totale complessivo	53	51.663.703,42 €	44.738.681,41 €	5.207.603,37 €	12%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

La tabella mostra il totale dei finanziamenti PNRR a disposizione del Comune per l'attuazione dei progetti, così come acquisiti al bilancio dell'Ente mediante accertamento.

Si registra, in particolare, una percentuale di risorse accertate pari a circa 44 milioni l'87 per cento del finanziamento totale (accertamenti sul totale dell'importo finanziato da PNRR).

I pagamenti, pari a 5,2 milioni, costituiscono il 12 per cento delle risorse accertate.

Per quanto riguarda i fondi richiesti e ottenuti dall'Ente in forma di anticipazione, ci si è basati sulle informazioni fornite dai revisori dei conti nella relazione sul PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025.

Nella tabella che segue sono compendiate i dati aggregati per missioni delle erogazioni ricevute a fronte di un finanziamento con fondi PNRR pari ad euro 51.663.703,42.

Tabella 6 - Anticipazioni per missioni


Etichette di riga	Somma di Importo anticipazione erogata
M1	-
M2	597.748,90 €
M4	992.983,22 €
M5	2.563.250,00 €
Totale complessivo	4.153.982,12 €

Fonte: Tabella PNRR revisori

La somma delle anticipazioni ottenute dal Comune di Cremona è pari a 4,1 milioni di euro e costituisce l'8,04 per cento (4,1 mln/51,6 mln) delle risorse finanziate; esse costituiscono risorse richieste dall'Ente a valere sul fondo di rotazione del MEF per un importo massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento.

Per quanto riguarda l'attuazione finanziaria si notano alcune differenze tra i progetti delle diverse missioni per quanto riguarda l'attuazione finanziaria.

Grafico 4 - Stato di attuazione finanziaria (Pagamenti su fondi accertati in bilancio)

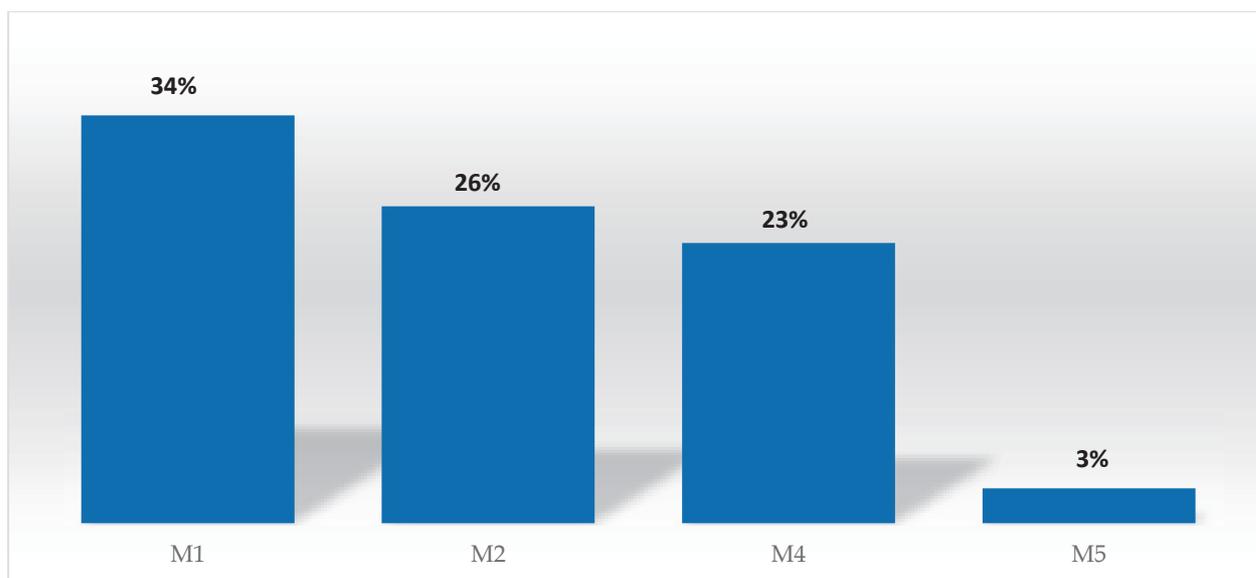

La maggiore quota di pagamenti sugli accertamenti, pari al 34 per cento circa, si rileva nella Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) a seguire la Missione M2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) e Missione 4 (Istruzione e ricerca) rispettivamente al 26 e 23 per cento.

Per la Missione 5 (Coesione e inclusione) il rapporto tra i pagamenti effettuati sugli accertamenti si attesta al 3 per cento.

Per quanto riguarda il dettaglio sullo stato dei pagamenti di ciascun progetto identificato mediante CUP, si rimanda alla tabella generale in calce alla presente relazione.

La Sezione rileva come il livello dei pagamenti complessivi, pari al 16 per cento dei fondi accertati in bilancio, sembri indicare che la rendicontazione delle spese allineata

alla tempistica della certificazione dei vari stati di avanzamento dei lavori, sia ancora all'inizio.

2.3 Effetti della rimodulazione

Nel giugno 2023 è stata resa pubblica la notizia di una proposta governativa di rimodulazione⁷ di alcune misure del PNRR presentata dalla cabina di regia alla Commissione Europea e approvata dal Consiglio dell'Unione Europea l'8 dicembre 2023, con un impatto di potenziale definanziamento di alcuni interventi.

Sul sito del Consiglio dell'Unione Europea è stata recentemente pubblicata la decisione che modifica la decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16051-2023-ADD-1/it/pdf>).

Le informazioni rese in merito dal Comune non si basano su specifiche comunicazioni dell'Amministrazione erogante, ma sono ricavate dal Dossier del 31 luglio 2023 n. 28/R/1 redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Non vi è, quindi, allo stato una indicazione analitica dei progetti interessati da definanziamento, ma solo una individuazione potenziale per categoria di interventi.

La proposta di rimodulazione è stata già comunque analizzata per il suo possibile impatto sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 16/2023/FRG) che ha rilevato: *“Tra le principali misure di competenza di Comuni e Città metropolitane espunte dal PNRR si annoverano interventi quali quelli relativi alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei centri abitati, iniziative di manutenzione e riuso di aree pubbliche ed edifici, nonché di rigenerazione e valorizzazione di aree urbane per le quali sono stati avviati progetti. Ne potrebbe derivare un rallentamento che amplia le difficoltà di realizzare l'ampio parco progetti presentati ed emerge, inoltre, la necessità che le coperture alternative intervengano tempestivamente per evitare l'interruzione dei lavori e il rischio di oneri aggiuntivi.”*

La tabella 7 indica in forma aggregata l'ambito di intervento ed i contributi PNRR interessati da un possibile definanziamento, con la precisazione, in precedenza sottolineata, di una discrasia tra gli importi indicati dal Comune per alcuni progetti rispetto a quelli risultanti da ReGiS.

⁷ I cui dettagli si trovano nel Dossier *“Monitoraggio dell'attuazione del PNRR - Le Proposte del governo per la revisione del PNRR e il capitolo RepowerEU”* pubblicato il 31 luglio 2023, a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

Per tale ragione la tabella che segue indica sia gli importi tratti dalla piattaforma ministeriale, sia -tra parentesi- quelli indicati dall'Ente in sede di riscontro istruttorio con riguardo alla Missione 5.

Tabella 7-Progetti oggetto di possibile definanziamento

Missione	CUP	Importo finanziato dal PNRR	Importo totale del progetto
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	1	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €
M5 Inclusione e coesione	5	8.991.000,00 € (10.351.002,84 €)	9.616.849,11 € (10.979.010,82 €)
Totale complessivo	6	10.001.000,00 € (11.361.002,84 €)	10.626.849,11 € (11.989.010,82 €)

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio.

**

Dagli elementi conoscitivi acquisiti è emerso che i progetti coinvolti dal possibile definanziamento sono 6, distribuiti su due interventi (M2C4 I.2.2 e M5.C2.I 2.1).

Il Comune di Cremona nel suo riscontro ha osservato che per tutti i progetti menzionati sono già stati assunti impegni di spesa e che:

“Per quanto riguarda la misura M5.C2.I 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” il Comune è risultato assegnatario di finanziamento per n. 5 interventi per un importo complessivo di € 10.351.002,84, ed è intervenuto con un cofinanziamento pari a € 628.007,98.

La fase progettuale è stata svolta affidando all'esterno i relativi servizi di Architettura e Ingegneria.

Per tutti i 5 interventi è in corso la stipula dei contratti e l'avvio dei lavori è programmato a partire da gennaio 2024.

Poiché alcuni di questi interventi sono previsti in edifici attualmente in uso per le attività istituzionali, si è già provveduto ad individuare e organizzare le sedi transitorie e relativi trasporti per garantire lo svolgimento delle attività senza soluzione di continuità.

Inoltre, l'Ente per cofinanziare i progetti assistiti da contribuzione statale, ha dovuto rimodulare la scala delle priorità complessive posticipando la realizzazione di altri interventi.

L'eventuale definanziamento o posticipo della disponibilità delle risorse già assegnate, comporterebbe diversi problemi, tra i quali:

1. nuovi costi per i servizi di Architettura e Ingegneria;
2. possibili contenziosi con gli operatori economici contrattualizzati;
3. interruzione o sospensione delle opere e delle forniture con inevitabili oneri aggiuntivi di varia natura.

La mancata attuazione o il differimento degli interventi non solo precluderebbe di dare risposta alle esigenze della comunità rientranti nelle finalità del bando, ma vanificherebbe le aspettative e la collaborazione di cui l'Ente ha potuto beneficiare nel rapporto con gli amministrati.

Per quanto riguarda la misura M2.C4.I 2.2 *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”*, la perdita delle risorse assegnate non consentirebbe la prevenzione e mitigazione dei danni connessi al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei centri abitati, degli edifici pubblici (miglioramento e adeguamento sismico) e di strade, ponti e viadotti.

Tabella 8-Stato di attuazione dei progetti oggetto di possibile definanziamento


Missioni	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuzione lavori /fornitura	Conclusi	Totale complessivo
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	1					1
M5 Inclusione e coesione		4	1			5
Totale complessivo	1	4	1			6

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio.

Per quanto riguarda l'avanzamento procedurale degli interventi (oggetto di istruttoria) che potrebbero essere definanziati, emerge che 5 progetti su 6 (un CUP non è incluso nel monitoraggio a preventivo 2023/2025 dell'Organo di Revisione) erano allineati al cronoprogramma al 30 giugno 2023, mentre, alla data del riscontro istruttorio (novembre 2023), uno risulta in avvio (M2) e i restanti 5 (M5) in attesa di stipula dei relativi contratti con l'avvio dei lavori a partire da gennaio 2024.

È possibile confrontare lo stato di attuazione dei progetti coinvolti dal definanziamento rispetto ai 53 progetti complessivi nel seguente grafico.

Grafico 5- Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento

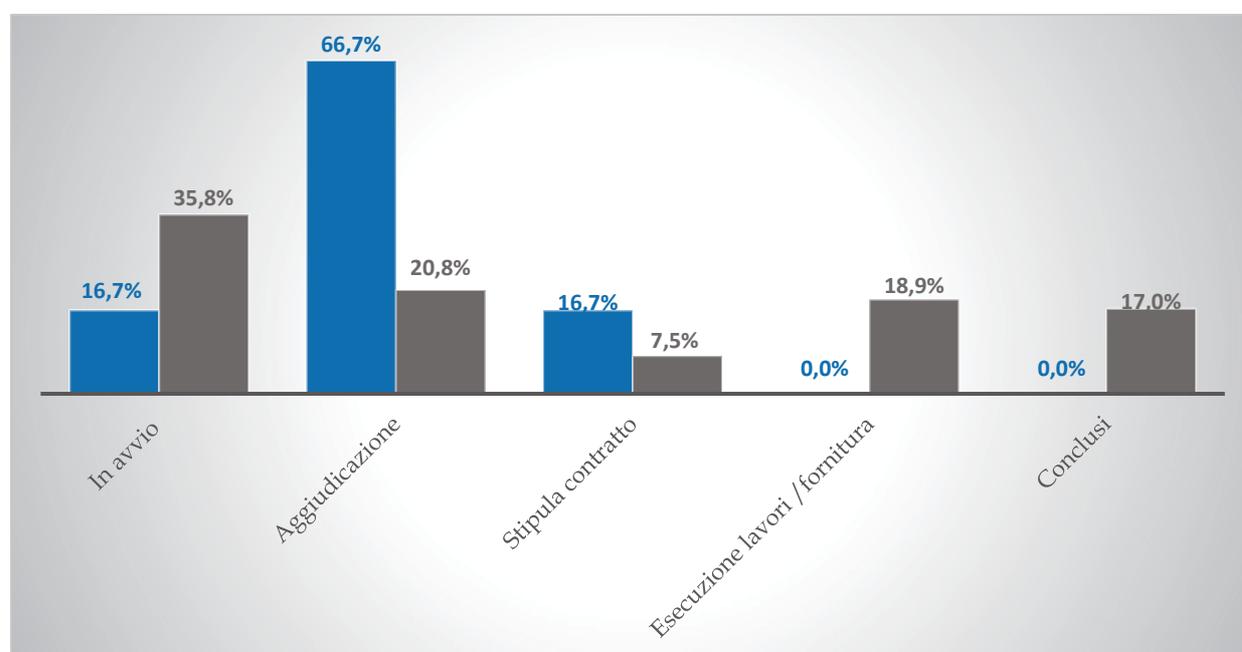

Legenda: con il blu si indica la percentuale dei progetti a seconda della fase di attuazione coinvolti dal definanziamento, mentre in grigio la percentuale sul totale dei 53 progetti.

La Sezione rileva che la quota degli importi coinvolti sul complesso dei finanziamenti PNRR appare di rilievo e, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un problema di copertura che richiederebbe di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell'Ente.

A ciò si aggiunge il rischio di oneri aggiuntivi e di contenziosi conseguenti agli impegni contrattuali già assunti, considerato che l'ipotesi di definanziamento riguarda progetti già in fase avanzata di esecuzione con conseguente possibilità di completamento, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse.

3. GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Nel 2022 con la delibera n. 253/2022/GEST è stato rilevato che, nel quadro delle disposizioni di governance del PNRR dettate dal d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, tutte le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR sono chiamate a provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.⁸

La complessità delle iniziative e i tempi serratamente definiti per il relativo avanzamento e completamento hanno richiesto alle Regioni e alle Province autonome l'adozione di schemi organizzativi a presidio della corretta e tempestiva implementazione delle misure ad esse affidate.

L'attività istruttoria espletata dalla Sezione nel corso del 2022 non aveva evidenziato la predisposizione di una *governance* dedicata da parte del Comune di Cremona.

Con nota del 17 aprile 2023 l'Ente ha ribadito che *"la struttura organizzativa... risulta, allo stato, adeguata con riferimento ai progetti di attuazione del PNRR previsti"*.

⁸ Per una disamina più ampia del quadro normativo in tema di governance del PNRR definita da d.l. n. 77/2021 si fa rinvio alla specifica memoria redatta dalla Corte dei conti, su richiesta dalle Commissioni riunite I (Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, approvata con deliberazione n. 11/SSRRCO/AUD/21 delle Sezioni riunite in sede di controllo e alla Relazioni delle Sezioni Riunite sullo stato di attuazione del PNRR n. 4 del 29 marzo 2022

4. SITUAZIONE DEL PERSONALE

4.1 Esperti della Regione

La Sezione con nota istruttoria del 21 marzo 2023 ha chiesto informazioni circa l'eventuale utilizzo del personale esperto assunto dalla Regione, nell'ambito della misura del PNRR M1C1-2.2 *"Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance"* per la semplificazione delle procedure amministrative degli enti locali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021⁹ col quale veniva stanziata la spesa aveva definito il perimetro dei compiti degli esperti e dei professionisti assunti dalle Regioni per l'Assistenza Tecnica (TA) *"finalizzata a supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, con particolare riferimento quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR..."*

Per questa misura, finanziata con 38,6 milioni in bilancio dal 2021, Regione Lombardia è stata chiamata a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi complessi e, in particolare, delle procedure propedeutiche all'implementazione dei progetti del PNRR.

Il Comune di Cremona nella risposta del 18 aprile 2023 ha dichiarato che *"L'Ente ha incontrato in una sola occasione i professionisti (esperti), selezionati dalla Regione Lombardia, destinati al supporto delle amministrazioni nello svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti."*

⁹ Il DPCM del 12 novembre 2021 all'art.1 stabiliva che *"il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, è erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a favore delle regioni e province autonome."* All'art.2 che *"il contributo di cui all'art. 1 è finalizzato al conferimento, da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR."* All'art.3 che *"ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento."* Infine, all'art.5 che i Piani territoriali *"sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza."* Con DPCM 29 novembre 2021, attuativo dell'art. 9 del d.l. n. 80/2021, di ripartizione delle risorse tra le Regioni, alla Regione Lombardia sono stati assegnati 38.632.000,00 euro per la contrattualizzazione di 123 esperti.

Tali esperti hanno riferito di potersi occupare dell'arretrato correlato a procedure complesse di Edilizia e Urbanistica (anno 2022) indicando le aree, di seguito evidenziate, su cui potrebbero garantire la loro assistenza:

1) Arretrato negli aggiornamenti catastali (assenza collaudo), correttezza archivio (vecchia numerazione fogli mappali), archivio cartaceo con troppe richieste di accesso agli atti per 110%, esigenza allegato fotogrammetrico;

2) Pratiche SUE esclusivamente Online, Pratiche SUAP esclusivamente online, istruttoria pratiche interna/esterna (CdS, SCIA antincendio, SCIA commerciali...), aggregazioni di Comuni, Sportelli accentrati sovracomunali

3) Verifica a campione CILA e CILAS o 100% 4) Servizi digitalizzazione, app IO, passaggio icloud, pago pa...

5) Espropri, contenziosi, procedimenti in autotutela ... etc.

Il settore Lavori Pubblici ha richiesto supporto su tematiche legate agli interventi PNRR, formulando appositi e specifici quesiti, ma tali richieste sono state povere di riscontri, verosimilmente anche in ragione delle competenze esclusive di ciascun ministero titolare di singoli bandi. Alla luce di quanto sin qui sperimentato, il supporto così come proposto è risultato poco utile ed efficace per l'Ente scrivente ai fini della effettiva realizzazione delle attività correlate al processo di attuazione del PNRR".

Nella nota del 23 novembre 2023 è stato specificato che "Da giugno 2023 il settore tecnico preposto alla programmazione e progettazione di opere pubbliche interessato da progetti PNRR/PNC non ha più interpellato gli esperti di cui alla task force "Investimento M1.C1.I.2.2" di Regione Lombardia in quanto, a seguito di precedente confronto con gli stessi, è emerso che le informazioni utili all'Ente non potevano essere da loro fornite.

Nel contempo, come evidenziato nella precedente relazione riferita all'istruttoria del 21.3.2023 prot. 4091 cui si rinvia, tali esperti hanno riferito di potersi occupare esclusivamente di questioni inerenti all'arretrato correlato a procedure complesse di Edilizia e Urbanistica (anno 2022).

Neppure il settore preposto alla gestione dei servizi sociali, incaricato della gestione di alcuni progetti PNRR inerenti la Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", ha ritenuto, per i motivi sopra richiamati, di interpellare gli esperti della citata task force".

4.2. Assunzioni di personale a tempo determinato

La Sezione ha chiesto informazioni circa le procedure di rinforzo dell'organico a supporto ai progetti del PNRR.

L'Ente ha dichiarato che nel mese di febbraio 2023 ha "attivato procedure selettive finalizzate alla definizione di graduatorie di idonei con profilo professionale di "istruttore tecnico", cat. C (area degli istruttori) e di "funzionario tecnico", cat. D (area dei funzionari e di elevata qualificazione) per assunzioni a tempo determinato da finanziare nell'ambito dei quadri economici di alcuni progetti PNRR.

Le candidature pervenute entro i termini previsti nell'avviso di selezione risultano essere di sole 3 unità (delle quali 2 hanno già ritirato la loro disponibilità a partecipare ai colloqui selettivi) per la cat. D e di 6 unità per la categoria C.

Tali candidature andranno verificate con riferimento a competenze e conoscenze nell'ambito di appositi colloqui.

Appare utile precisare che l'avviso è stato pubblicato, per un mese, nel portale governativo del reclutamento (InPA), all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, sulla pagina facebook del Comune nonché divulgato attraverso altri canali/piattaforme (Linkedin, Concorsando, Concorsipubblici). Nel Piano dei fabbisogni 2022/24, annualità 2022, è stata inserita la previsione assunzionale di 3 istruttori/funzionari tecnici con spesa eterofinanziata (a carico risorse PNRR ex art. 1, DL n. 80/2021): l'organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole in ordine al suddetto Piano".

Successivamente (nota del 24 novembre 2023) è stato comunicato che "con riguardo alla selezione per funzionari tecnici, delle tre candidature pervenute nei termini previsti dal bando, un candidato ha rinunciato a sostenere la prova selettiva, un candidato è risultato assente e un candidato è risultato non idoneo; conseguentemente, non è stato possibile stilare alcuna graduatoria e, quindi, procedere con le relative assunzioni.

Con riferimento alla selezione per istruttori tecnici, dei tre candidati che hanno sostenuto la prova selettiva con esito favorevole (determinazione dirigenziale n. 727 del 5.5.2023 di approvazione della graduatoria finale), l'Ente ha proceduto ad assumerne due, mediante contratto a tempo pieno e determinato per la durata di 18 mesi, con decorrenza 3 luglio 2023.

Tali figure sono state assegnate per l'espletamento di attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi: "PNRR- M4C1INV. 3.3. per intervento di adeguamento sismico alle scuole Secondarie di primo grado A. Frank e Virgilio" e "PINQuA M5C2I2 3.1. costruzione nuovo polo infanzia Martiri della Libertà".

Le assunzioni sono state effettuate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 bis del d.l. n. 152/2021, sono state finanziate con risorse proprie di bilancio in deroga ai limiti di spesa previsti per i contratti di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010) e sono state oggetto di preventiva asseverazione da parte del Collegio dei revisori dei conti, in quanto inserite nel Piano dei fabbisogni di personale (ora sezione specifica del PIAO), in ordine al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e risultano inferiori, in termini di spesa, ai valori di cui alla tab. 1 allegata al citato decreto-legge.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione avviata nel marzo 2023 e aggiornata al 24 novembre 2023, nonché dei dati estrapolati da ReGiS, si espone il seguente quadro di sintesi.

➤ *PNRR*

Il Comune di Cremona risulta soggetto attuatore di 53 progetti (ciascuno identificato da un Codice Unico di Progetto, detto CUP) per un ammontare complessivo di fondi del PNRR pari a 51,6 milioni. La Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità) accentra la maggiore quota di fondi (87 per cento) e concentra il numero maggiore di CUP (25 di 53 totali). Risultano inoltre altre risorse (FOI per euro 4,2 milioni, fondi propri del Comune per 3,9 milioni di euro, altre fonti pubbliche per euro 0,5 milioni, per un totale di progetti PNRR di 60,2 milioni).

➤ *Attuazione procedurale*

Premessa la specificazione riportata al paragrafo 2.3:

- il 35,8 per cento dei CUP è in fase di avvio
- il 20,8 per cento in fase di aggiudicazione
- il 7,5 per cento alla stipula del contratto con il soggetto esecutore
- il 18,9 per cento dei i lavori e/o le forniture sono in fase di esecuzione
- il 17 per cento dei progetti risultano completati.

➤ *Cronoprogramma*

Dalla Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025 al termine del primo semestre 2023, per il 98 per cento dei CUP si riscontra un allineamento dei tempi procedurali al cronoprogramma. Si tratta di 48 su 49 progetti monitorati e su 53 progetti complessivi.

➤ *Avanzamento finanziario*

Le risorse accertate pari all'87 per cento circa dei fondi complessivi a disposizione dell'Ente in qualità di soggetto attuatore o beneficiario. I pagamenti complessivi costituiscono il 12 per cento dei fondi accertati in bilancio (con una eterogenea distribuzione tra i CUP) a conferma che l'avanzamento esecutivo degli interventi è ancora all'inizio.

➤ ***Anticipazioni ricevute***

Sono pari a 4,1 milioni di euro e costituiscono l'8 per cento (4,1 mln/51,66 mln) delle risorse finanziate da PNRR.

➤ ***Ipotesi rimodulazione***

Rispetto alla proposta governativa di definanziamento, approvata dalla Commissione Europea e dal Consiglio UE, il Comune non ha ancora ricevuto formali comunicazioni. Sulla base di quanto riportato nel Dossier della Camera dei Deputati del 31 luglio 2023 n. 28/R/1, l'Ente dichiara che potrebbero essere coinvolti 6 progetti nell'ambito degli interventi M2C4 I.2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" e M5C2 I.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale". L'importo che potrebbe essere oggetto di definanziamento è di 9 milioni di euro (10 secondo i dati del Comune) pari al 19 per cento se rapportato all'importo complessivo di fondi PNRR determinato in 51 milioni.

La Sezione rileva che la quota degli importi interessati sul complesso dei finanziamenti PNRR appare di rilievo e che, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un problema di copertura che richiederebbe di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell'Ente. D'altra parte, va evidenziato come i progetti che potrebbero essere interessati dall'ipotesi di definanziamento si trovino di avanzata esecuzione e, in taluni casi, già completati; vanno, quindi, sottolineate le possibili gravose conseguenze correlate al sorgere di contenziosi ed ai costi generali di gestione nell'eventualità di interruzione o sospensione degli interventi. Nelle successive verifiche

sull'attuazione del PNRR si valuteranno gli effetti del definanziamento sugli specifici progetti e le misure messe in campo dal Comune a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

➤ **Misure organizzative**

Il Comune ha dichiarato di aver adottato specifiche misure organizzative interne per fronteggiare gli adempimenti richiesti per l'attuazione del PNRR, senza fornire ulteriori indicazioni.

➤ **Personale di supporto PNRR**

Dal mese di giugno 2023 il settore tecnico preposto alla programmazione e progettazione di opere pubbliche interessato da progetti PNRR ha interrotto l'interlocuzione avviata con gli esperti di cui alla task force "Investimento M1.C1.I.2.2" di Regione Lombardia, in quanto questi ultimi avrebbero assicurato supporto esclusivamente su questioni inerenti all'arretrato correlato a procedure complesse di Edilizia e Urbanistica.

Per quanto riguarda eventuali assunzioni di personale a tempo determinato, l'Ente ha pubblicato, nel mese di febbraio 2023, un bando per la formazione di due distinte graduatorie finalizzate, rispettivamente, ad assunzioni a tempo determinato di personale con profilo professionale di funzionario tecnico (area dei funzionari) e ad assunzioni a tempo determinato di personale con profilo professionale di istruttore tecnico (area degli istruttori), nell'ottica di garantire supporto ai settori competenti per l'attuazione di progetti finanziati con risorse PNRR. Non è stato possibile stilare alcuna graduatoria per funzionari tecnici e, quindi, procedere con le relative assunzioni a causa di rinunce e di inidoneità dei concorrenti, mentre sono stati assunti due istruttori tecnici, con contratto a tempo determinato per 18 mesi, con decorrenza 3 luglio 2023.

Tabella 9- Elenco dettagliato dei progetti del Comune di Cremona

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
1	M1.C1.I 1.2 Abilitazione e facilitazione al migrazione Cloud	D11C22000480006	PNRR M1C1-INV. 1.2 - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP D11C22000480006	419.124,00 €	419.124,00 €	419.124,00 €	419.200,00 €	364.562,03 €	Determinazione dirigenziale n. 298/2021 "Stipula dell'accordo di collaborazione tra Aria SpA e Comune di Cremona per la fruizione di infrastrutture ICT con l'adozione di un nuovo modello di servizi infrastrutturali basato sul paradigma multi cloud ibrido"	Progetto asseverato positivamente dal DTD. Presentata richiesta di erogazione finanziamento su PA Digitale 2026
2	M1.C1.I 1.3.1 Piattaforma nazionale digitale dei dati	D51F22005770006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)	162.748,00 €	162.748,00 €	162.748,00 €	162.748,00 €	- €	determinazione dirigenziale 657 del 24/04/2023 Oggetto: PNRR M1C1I1.3 "Dati e interoperabilità" - Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati". Accertamento del contributo statale per l'integrazione delle API - Application Programming Interface - nel Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (CUP D51F22005770006).	

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
3	M1.C1.I 1.4.1 Citizen experience Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	D11F22003300006	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1."ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	328.160,00 €	328.160,00 €	328.160,00 €	328.160,00 €	- €	Determinazione dirigenziale 373/2023 del 13/03/2023 PNRR M1C1I1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". Accertamento del contributo statale per i servizi di progettazione e sviluppo compresi nel processo di adesione ai modelli standard di sito comunale e servizi digitali al cittadino tramite l'Investimento 1.4.1 - "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Citizen experience" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (CUP D11F22003300006).	Progetto in fase di contrattualizzazione
4	M1.C1.I 1.4.3 Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App "IO"	D11F22001710006	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3."ADOZIONE APP IO" CUP D11F22001710006	30.576,00 €	30.576,00 €	30.576,00 €	30.576,00 €	- €	determinazione dirigenziale 388 del 14/03/2023 Oggetto: PNRR M1C1I1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.3 "Adozione APP IO". Accertamento del contributo statale per la migrazione e l'attivazione dei servizi digitali dell'ente sull'APP IO - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione APP IO" finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (CUP D11F22001710006).	

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCANTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
5	M1.C1.I 1.4.3 Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App "IO"	D11F2200390006	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3."ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP D11F22003900006	63.735,00 €	63.735,00 €	63.735,00 €	63.735,00 €	- €	Determinazione dirigenziale 1121/2023 del 04/07/2023 PNRR M1C1I.4 - Next Generation EU - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3."ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP D11F22003900006 - Migrazione e attivazione dei servizi di incasso dell'Ente sulla piattaforma PagoPa. Ricognizione del progetto.	Progetto in fase di realizzazione delle attività
6	M1.C1.I 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	D11F2200089006	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4."ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE - SPID CIE" CUP D11F22000890006	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	determinazione n. 1268 del 26/07/2023 Oggetto: PNRR M1C1I.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID e CIE" finanziata dall'Unione Europea- Next Generation EU. Affidamento diretto alla ditta Ancilab Srl con sede a Milano del servizio di erogazione di un piano formativo idoneo al passaggio tecnologico al protocollo OpenID Connect (CUP D11F22000890006).	Progetto asseverato positivamente dal DTD. Presentata richiesta di erogazione finanziamento su PA Digitale 2026

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
7	M1.C1.I 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	D11F22 0027000 06	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" CUP: D11F22002700006	59.966,00 €	59.966,00 €	59.966,00 €	59.966,00 €	- €	Determinazione dirigenziale 388/2023 del 14/03/2023 PNRR M1C1I1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.3 "Adozione APP IO". Accertamento del contributo statale per la migrazione e l'attivazione dei servizi digitali dell'ente sull'APP IO - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione APP IO" finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (CUP D11F22001710006).	Progetto in fase di asseverazione da parte del DTD. Ultimo atto in pubblicazione DD n.495 del 30/03/2023: PNRR M1C1I1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.5 "Notifiche Digitali" finanziata dall'Unione Europea- Next Generation EU. Affidamento diretto alla ditta ICA Imposte Comunali Affini Srl con sede a Roma per l'attivazione dell'interconnessione del servizio in modalità SaaS "Vigilando" con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) e l'integrazione con PND delle comunicazioni relative alle violazioni al Codice della Strada e violazioni extra Codice della Strada. (CUP D11F22002700006).

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
8	M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	D19J22 0005600 01	Cremona smart waste: misurazione innovativa dei rifiuti urbani per la tariffa puntuale	1.140.575,31 €	1.140.575,31 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	DELIBERAZIONE 239 DEL 18/10/2023 Oggetto: PNRR - M2C11I1.1 - Finanziamento dell'Unione Europea - Next Generation EU - CUP D19J22000560001 Progetto "CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE" - Autorizzazione al Legale Rappresentante per l'accettazione del contributo concesso con Decreto Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE n. 243/2023 e sottoscrizione dell'atto d'obbligo	Accoglimento della richiesta di modifica cronoprogramma con P.G. n. 89114/2023 del Comune di Cremona; ultimo atto adottato: Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 31 ottobre 20123 avente per oggetto "PNRR M2C11/1.1 - Finanziamento dell'Unione Europea - Next Generation EU - CUO D19J22000560001 Progetto "CREMONA SMART WASTE. MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE" - Modifica cronoprogramma
9	M2.C2.I 4.4 Rinnovo flotte bus e treni verdi	D10J22 0000000 01	Rinnovo flotte bus e treni verdi	5.977.489,00 €	5.977.489,00 €	5.977.489,00 €	597.748,90 €	597.748,90 €	Determinazione dirigenziale 1355/2023 del 07/08/2023 OGGETTO PNRR M2/C2 INV. 4/4 NEXT GENERATION EU "Rinnovo flotte bus e treni verdi" subinvestimento 4.4.1 "Bus": acquisto di autobus ad emissione zero dalla ditta Arriva Italia s.r.l. di Milano. Approvazione della spesa e del cronoprogramma (CUP D10J22000000001).	Aggiudicazione provvisoria prot. 6962 del 16/11/2023. Termini da decreto di finanziamento: 31/12/24 acquisto n. 2 bus e 30/06/2026 n.8 bus. Importo complessivo in ReGiS corretto .

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
10	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D11E20000140001	CUP: D11E20000140001 - riscaldamento palestra scuola Bissolati	57.340,00 €	57.340,00 €	57.340,00 €	58.000,00 €	57.340,00 €	Determinazione dirigenziale 1360/2020 del 05/10/2020 OGGETTO Scuola Primaria Bissolati - Interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento della palestra. Affidamento dell'intervento alla ditta Linea Green S.p.A. di Cremona e approvazione della spesa. CUP: D11E20000140001	
11	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D14D23000880006	Efficientamento energetico edifici scolastici	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	19.458,10 €	N.D.	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. Importo complessivo speso 19.458,10 euro, da aggiornare in ReGIS.
12	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D14D23000890006	Efficientamento energetico	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	- €	N.D.	Efficientamento energetico edifici scolastici nidi e materne- ANNO 2023. DD di approvazione/ validazione progetto e affidamento lavori n. 1498/ 2023 del 06/09/23. Consegna lavori avvenuta entro il 15/09/23, in attesa fornitura materiale. Termini da decreto di finanziamento: consegna lavori entro il 15/09/23 e fine lavori entro il

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
										31/12/2024. importo complessivo corretto .
13	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D14E21022720001	Sostituzione satelliti riscaldamento alloggi ERP via Mosconi ANNO 2021 - (commi 29-36 Legge 160/2019) - CUP: D14E21022720001	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	29.431,80 €	determinazione dirigenziale n. 1454 del 20/08/2021 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria nel condominio ERP di via Mosconi 17 relativi alla sostituzione dei "satelliti d'utenza" per la gestione dell'acqua per teleriscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria. Affidamento, tramite piattaforma Sintel, alla ditta Linea Green S.p.A. di Cremona, approvazione della spesa e del quadro economico (CUP: D14E21022720001).	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. Importo complessivo speso 29.431,80 euro, da aggiornare in ReGIS.
14	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza	D14H20001150001	Interventi adeguamento e messa in sicurezza scuole materne ANNO 2020 - (commi 29-36 Legge	25.005,47 €	25.005,47 €	25.000,00 €	25.000,00 €	23.236,03 €	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE C1847 DEL 18/10/2023 Oggetto: PNRR M2C4I2.2-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. importo complessivo speso 23.236,03 euro, da aggiornare in ReGIS

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
	energetica dei Comuni		160/2019) - CUP: D14H20001150001						Generation EU: Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di alcune scuole dell'infanzia. Accertamento dell'importo della compensazione prezzi e contestuale approvazione della relativa spesa da corrispondere alla Ditta Officine Pagliari s.r.l. di Crema (CR). Approvazione del quadro economico finale dell'intervento-CUP D14H20001150001-CIG Z822EDFA27.	
15	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D14H20001160001	CUP: D14H20001160001 - riscaldamento scuola Bissolati	66.622,00 €	66.622,00 €	66.622,00 €	67.000,00 €	66.622,00 €	Determinazione dirigenziale 1357/2020 del 05/10/2020 OGGETTO Scuola Primaria Bissolati - Interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento. Affidamento dell'intervento alla ditta Linea Green S.p.A. di Cremona e approvazione della spesa. CUP: D14H20001160001.	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. importo complessivo in ReGiS corretto .

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
16	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D14J2200040001	Riqualificazione energetica impianto Palestra Cavatigozzi ANNO 2022 - (commi 29-36 Legge 160/2019) CUP: D14J22000400001	99.950,00 €	99.950,00 €	99.950,00 €	99.950,00 €	92.818,00 €	Determinazione dirigenziale 463/2023 del 28/03/2023 OGGETTO PNRR M2C4I2.2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra di Cavatigozzi. Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria. - CUP: D17H21001150001.	Rendicontazione in corso, conclusione prevista per gennaio 24. Importo complessivo in ReGiS corretto .
17	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D14J2200041001	Riqualificazione energetica impianto Palestra Cambonino ANNO 2022 - (commi 29-36 Legge 160/2019) CUP: D14J22000410001	70.050,00 €	70.050,00 €	70.050,00 €	70.025,00 €	- €	determinazione dirigenziale n. 1760 del 26/10/2022 Oggetto: PNRR - M2-C4 Inv. 2.2. NEX GENERATION EU. Modifica e integrazione, relativa all'approvazione del Verbale di Validazione, della determinazione dirigenziale n. 1474 del 13 settembre 2022. CUP: D14J22000410001 - CIG: 9389548421.	Rendicontazione in corso, conclusione prevista per gennaio 24. Importo complessivo 70.050 euro, da aggiornare in ReGiS.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
18	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D15F21003220001	Messa in sicurezza vetri serramenti interni scuola primaria Trento Trieste ANNO 2021 - (commi 29-36 Legge 160/2019) - CUP: D15F21003220001	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	13.826,55 €	determinazione dirigenziale n. 1428 del 16/08/2021 Oggetto: Scuola Primaria Trento Trieste. Intervento di messa in sicurezza con posa di pellicole dei vetri di alcuni serramenti. Affidamento dell'intervento alla ditta TOPFILM S.r.l. di Padova. Approvazione del quadro economico dell'intervento e della relativa spesa. CUP: D15F21003220001.	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. importo complessivo speso 13.826,55 euro, da aggiornare in ReGiS.
19	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D15H18000970004	CUP: D15H18000970004 - messa in sicurezza Camino Loggia dei militi	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	33.596,36 €	Determinazione dirigenziale 2242/2020 del 28/12/2020 OGGETTO Messa in sicurezza del camino posto sulla copertura della Loggia dei Militi. Affidamento di piccoli interventi di riparazione sui paramenti murari alla ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l. di Caorso (PC) e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D15H18000970004.	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. importo complessivo in ReGiS corretto.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
20	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D16B20000460001	Interventi straordinari adeguamento antincendio scuola primaria S.Ambrogio ANNO 2021 - (commi 29-36 Legge 160/2019) - CUP: D16B20000460001	40.747,90 €	40.747,90 €	40.747,90 €	46.000,00 €	36.760,96 €	determinazione dirigenziale n. 1335 del 03/08/2023 Oggetto: Interventi per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi della centrale termica della scuola primaria Sant'Ambrogio. Approvazione della spesa per l'inoltro, al Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio (CUP: D16B20000460001).	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. importo complessivo speso 36.733,17 euro, da aggiornare in ReGiS.
21	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D16B20000470001	Interventi straordinari adeguamento antincendio scuola Manzoni ANNO 2021 - (commi 29-36 Legge 160/2019) - CUP: D16B20000470001	46.000,00 €	46.000,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €	35.910,77 €	determinazione dirigenziale n. 2317 del 14/12/2022 Oggetto: PNRR - M2C4-INV 2.2. Interventi per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola primaria Manzoni sede di via Tofane, affidati alla ditta Power Teck S.r.l. di Lodi. Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché approvazione del quadro finale dei lavori e degli attestati di regolare esecuzione. CUP: D16B20000470001.	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. Importo complessivo speso 39.211,46 euro, da aggiornare in ReGiS.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
22	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D17H21001150001	Rifacimento pavimentazione palestra Cavatigozzi ANNO 2021 - (commi 29-36 Legge 160/2019) - CUP: D17H21001150001	268.309,65 €	268.309,65 €	153.000,00 €	219.504,75 €	262.290,01 €	determinazione dirigenziale n. 463 del 28/03/2023 Oggetto: PNRR M2C4I2.2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra di Cavatigozzi. Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria. - CUP: D17H21001150001.	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. importo complessivo speso 263.589,41, da aggiornare in ReGIS
23	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D17H21003220001	Ripristino copertura Museo della Civiltà Contadina ANNO 2021 - (commi 29-36 Legge 160/2019) - CUP: D17H21003220001	54.449,76 €	54.449,76 €	45.000,00 €	54.449,76 €	50.243,86 €	determinazione dirigenziale n. 1951 del 27/10/2023 Oggetto: PNRR M2C4I2.2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina, aggiudicati all'Impresa Edile De Carli Andrea s.r.l. di Capralba (CR). Approvazione del quadro economico finale definitivo-CUP: D17H21003220001.	Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. Importo complessivo speso 53.588,98 euro, da aggiornare in ReGIS

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
24	M2C2I4.4.1 Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	D10J2000040008	Comune di Cremona LV	6.230.086,33 €	6.230.373,00 €	6.230.086,33 €	6.230.086,00 €	1.246.017,20 €	N.D.	ACQUISTO BUS E INFRASTRUTTURE DI RICARICA (PSNMS) - Aggiudicazione provvisoria prot. 6962 del 16/11/2023. Termini da bando: aggiudicazione contratto attuativo entro 31/12/23, consegna entro 31/12/25. Importo complessivo 6.230.373, da aggiornare in ReGiS. 64 euro.
25	M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	D15F22000930001	SOTTOPASSO DI VIA BERGAMO*VIA BERGAMO*INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA BERGAMO	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €	- €	N.D.	In fase di ricerca del professionista a cui affidare la progettazione esecutiva. Importo complessivo corretto.Da Decreto di assegnazione termine per aggiudicazione entro il 21/10/24 , 30/09/25 per liquidazione di almeno il 30% delle opere,CRE entro il 31/03/26. Erogazioni tranches contributo:

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
										20% acconto, 70% sulla base della rendicontazione trasmessa e 10% saldo.
26	M4.C1.I 1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	D15F22000440006	Intervento di adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste	341.602,83 €	351.602,83 €	327.513,80 €	327.513,80 €	150,00 €	Determinazione dirigenziale 1388/2023 del 10/08/2023 OGGETTO PNRR-M4C1I1.3-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativo accertamento CUP: D15F22000440006.	DD approvazione e validazione progetto esecutivo n. 1388/2023 del 10/08/23, DD indizione gara n. 2054/2023 del 08/11/23, in corso procedura negoziata. Aggiudicazione prevista per il 31/12/23. Termini da atto d'obbligo : 31/12/23 aggiudicazione, 31/03/24 avvio lavori, 31/03/26 conclusione lavori e e 30/06/26 collaudo. Importo complessivo 351.602,83 euro, in ReGiS da aggiornare.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
27	M4.C1.I 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	D18E1800080006	Intervento adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado "Anna Frank" - CUP: D18E1800080006	3.464.103,35 €	3.464.103,35 €	2.016.000,00 €	2.456.093,11 €	614.113,58 €	Determinazione dirigenziale 1844/2023 del 18/10/2023 OGGETTO PNRR - Next Generation EU - M4 C1 - INV 3.3 DNSH Regime 2 - Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Affidamento delle prestazioni relative all'aggiornamento della relazione geologica, idrogeologica e sismica già redatta nel 2017 alle nuove norme NTC 2018 al dott. geol. Gaetano Guadagni e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D18E1800080006 CIG: A01E078F9E)	Esecuzione lavori in corso. Termini da atto d'obbligo: 15/09/23 aggiudicazione, 30/11/23 avvio lavori, 31/03/26 conclusione lavori e 30/06/26 collaudo. Importo complessivo in ReGiS corretto .
28	M4.C1.I 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	D18E1800090006	Intervento adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado "Virgilio" - CUP: D18E1800090006	4.990.968,56 €	4.990.968,56 €	2.789.600,00 €	3.596.088,19 €	866.710,22 €	Determinazione dirigenziale 1344/2023 del 04/08/2023 OGGETTO PNRR - Next Generation EU - M4 C1 - INV 3.3 DNSH Regime 2 - Interventi di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio. Affidamento del servizio di ingegneria e architettura di collaudatore tecnico-amministrativo e di collaudatore statico in corso d'opera all'ing. Giovanni Losi e approvazione del nuovo quadro economico. (CUP: D18E1800090006)	Esecuzione lavori in corso. Termini da atto d'obbligo: 15/09/23 aggiudicazione, 30/11/23 avvio lavori, 31/03/26 conclusione lavori e 30/06/26 collaudo. Importo complessivo in ReGiS corretto .

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
									CIG: 9894360C29)	
29	M5.C2.I 1.1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionali zzazione Intervento 1)Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	D24H2 1000040 007	Sostegno alla genitorialità e prevenzione vulnerabilità famiglie e bambini	211.500,00 €	211.500,00 €	211.500,00 €	115.648,00 €	- €	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 200 COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 2022 Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale". Presa d'atto schede progettuali presentate e approvate e sottoscrizione dei relativi accordi per la realizzazione.	
30	M5.C2.I 1.1.2 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionali zzazione Intervento 2)Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani	D14H2 2000650 007	Autonomia degli anziani non autosufficienti	2.459.496,00 €	2.459.496,00 €	2.459.496,00 €	1.712.517,71 €	- €	N.D.	

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
31	M5.C2.I 1.1.3 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione Intervento 3)Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale	D34H2 2000500 007	Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	237.256,42 €	- €	N.D.	
32	M5.C2.I 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità	D24H2 2000490 001	CUP: D24H22000490001 Percorsi di autonomia persone con disabilità	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	518.501,00 €	29.999,80 €	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 200 COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 2022 Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale". Presa d'atto schede progettuali presentate e approvate e sottoscrizione dei relativi accordi per la realizzazione.	rivedere ReGiS per fase procedurale: il contratto caricato è relativo a incarico supporto RUP (da caricare DL) - lavori strutturali non ancora affidati: FASE AGGIUDICAZIONE

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
33	M5.C2.I 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità	D24H2 2000500 007	CUP: D24H22000500007 Percorsi di autonomia persone con disabilità	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	251.974,00 €	- €	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 200 COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 2022 Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale". Presa d'atto schede progettuali presentate e approvate e sottoscrizione dei relativi accordi per la realizzazione.	
34	M5.C2.I 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di posta	D14H2 2000630 007	Housing temporaneo	710.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €	210.000,00 €	- €	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 200 COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 2022 Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale". Presa d'atto schede progettuali presentate e approvate e sottoscrizione dei relativi accordi per la realizzazione.	

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
35	M5.C2.I 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di posta	D14H2 2000640 007	Stazioni di posta	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	- €	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 200 COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 2022 Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale". Presa d'atto schede progettuali presentate e approvate e sottoscrizione dei relativi accordi per la realizzazione.	
36	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	D11B21 0007300 01	(DPCM 21/01/2021) - Realizzazione di pista ciclabile quartiere Boschetto CUP: D11B21000730001	1.330.000,00 €	1.330.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.594,26 €	Determinazione dirigenziale 1913/2023 del 25/10/2023 OGGETTO PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.3 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto compreso tra via N. Sauro e via Crocile e tratto di collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico. Modifica finanziamento D.D. n° 2496 del 23/12/2022, approvazione nuovo quadro economico e contestuale variazione a sensi art. 175, comma 5 quater lett. b) e lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000 per	DD aggiudicazione n. 1647/2023 del 28/09/23. I contenuti del contratto sono stati condivisi con l'impresa e inviate delle integrazioni documentali. A seguito di un incontro con la ditta si è definita la consegna dei lavori entro fine 2023. Si prevede stipula contratto entro fine novembre 23. Termini da decreto di finanziamento+proroga: aggiudicazione entro il 30/09/23 e stipula contratto entro il 31/12/2023.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
									ridefinizione cronoprogramma. (CUP: D11B21000730001 CIG: 936971556B)	Importo complessivo corretto in ReGiS.
37	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	D15F21000370001	(DPCM 21/01/2021) - Messa in sicurezza scale cavalcavia Civico Cimitero - CUP: D15F21000370001	470.282,70 €	779.244,41 €	400.000,00 €	708.961,71 €	- €	Determinazione dirigenziale 1881/2023 del 23/10/2023 OGGETTO PNRR M5C2-I 2.1 - Finanziamento dell'Unione Europea - Next Generation EU- CUP D15F21000370001 - CIG 9656229C3E - Intervento restauro e messa in sicurezza dello scalone prospiciente il Civico Cimitero - Servizio di architettura e ingegneria per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo, di direzione lavori delle opere architettoniche, delle strutture, di C.S.P e C.S.E al Rtp Mazzoleni -Belotti - Pierazzini- Presa d' atto del riparto dell'importo dell'affidamento tra i professionisti.	DD aggiudicazione n.1785/2023 del 12/10/23. In attesa stipula contratto entro 31/12/23. Termini da decreto di finanziamento+proroga: aggiudicazione entro il 30/09/23 prorogata al 31/10/23 e stipula contratto entro il 31/12/2023. Importo complessivo 779.244,41 euro complessivo, ReGiS da aggiornare.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
38	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	D15F2100045001	(DPCM 21/01/2021) - Riqualificazione, messa in sicurezza e rifunionalizzazione del palazzo ex Duemiglia - CUP: D15F21000450001	5.182.190,00 €	6.190.390,00 €	5.041.000,00 €	4.602.757,82 €	322.997,15 €	Determinazione dirigenziale 1950/2023 del 27/10/2023 OGGETTO PNRR - M5C2I2.1 - DNSH 2 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Palazzo ex Duemiglia: restauro e risanamento conservativo e riqualificazione energetica con destinazione finale ad uso uffici. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta Ediltor s.r.l. di San Paolo di Torrile (PR), approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa (CUP: D15F21000450001 - CIG: A0080B6804).	DD aggiudicazione n. 1950/2023 del 18/10/23. In corso predisposizione del contratto. Termini da decreto di finanziamento + proroga: aggiudicazione entro il 30/09/23 prorogata al 31/10/23 e stipula contratto entro il 31/12/2023. Importo complessivo 6.190.390 euro da aggiornare in ReGIS.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
39	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	D15F2100046001	(DPCM 21/01/2021) - Riqualficazione, messa in sicurezza Scuola Primaria quartiere Boschetto - CUP: D15F21000460001	1.565.290,55 €	1.595.290,55 €	1.350.000,00 €	1.392.841,13 €	- €	Determinazione dirigenziale 1953/2023 del 27/10/2023 OGGETTO PNRR-M5C2I2.1-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto. Pubblicazione dell'esito di gara. Approvazione della relativa spesa e del nuovo Quadro Economico-CUP D15F21000460001.	DD aggiudicazione n. 1918/2023 del 25/10/23. In attesa stipula contratto entro il 31/12/23. Termini da decreto di finanziamento+proroga: aggiudicazione entro il 30/09/23 prorogata al 31/10/23 e stipula contratto entro il 31/12/2023. importo complessivo 1.595.290,55 euro, da aggiornare in ReGiS.
40	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	D17H21001130001	(DPCM 21/01/2021) - Riqualficazione, messa in sicurezza Centro Civico quartiere Boschetto - CUP: D17H21001130001	1.069.085,86 €	1.084.085,86 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	53.080,41 €	Determinazione dirigenziale 1954/2023 del 27/10/2023 OGGETTO PNRR-M5C2I2.1-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del quartiere Boschetto. Pubblicazione dell'esito di gara. Approvazione della relativa spesa e del nuovo Quadro Economico-CUP D17H21001130001.	DD aggiudicazione n. 1837/2023 del 18/10/23. Inviata pec al ministero con segnalazione possibile mancata stipula contratto causa preavviso di ricorso. Termini da decreto di finanziamento+proroga: aggiudicazione entro il 30/09/23 prorogata al 31/10/23 e stipula contratto entro il 31/12/2023. importo complessivo 1.084.085,86 euro, da aggiornare ReGiS.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
41	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	D11B21000150005	Interventi sulla viabilità intersezione via Ciria-via Trebbia - CUP: D11B21000150005	499.392,87 €	499.392,87 €	405.994,37 €	405.394,93 €	5,30 €	Determinazione dirigenziale 1153/2023 del 10/07/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 83 M5-C2-I2.3.1 - DNSH Regime 2 Interventi sulla mobilità intersezione via Ciria/via Trebbia. Approvazione della spesa da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo relativo alla procedura d'appalto effettuata da Invitalia per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento. (CUP: D11B21000150005 - CIG: 91813100B3)	Accordo Quadro invitatia. Il progetto è stato verificato positivamente, si rimane in attesa del rapporto finale di verifica che verrà inviato entro 23/11/23. Si prevede di approvare e validare il progetto esecutivo entro il termine. Sottoscrizione ODA prevista per il 04/12/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23: invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23. Importo complessivo in ReGiS corretto .

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
42	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	D13D21000080005	Interventi sul verde - Lungo Po Europa - CUP: D13D21000080005	226.561,98 €	226.561,98 €	204.619,84 €	225.081,82 €	4.127,06 €	Determinazione dirigenziale 1392/2023 del 11/08/2023 OGGETTO PNRR-M5C2I2.3-DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 85-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riqualficazione di Via Lungo Po Europa. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Cartocci Strade s.r.l. di Villa Guardia (CO) e approvazione del nuovo Quadro Economico - CUP D13D21000080005 - CIG 9888392F35.	Contratto stipulato in data 20/10/23, consegna lavori il 02/10/23, lavori in corso. Inviata pec al ministero con DD a contrarre + QE relazione RUP in data 05/10/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23: invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23.Importo complessivo in ReGiS corretto .
43	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riqualficazione e incremento	D13H20000010004	Demolizione e costruzione nuovo Polo per l'Infanzia"Martiri della Libertà" - CUP: D13H20000010004	4.629.214,70 €	4.629.214,70 €	3.592.875,00 €	4.311.450,00 €	176.654,65 €	Determinazione dirigenziale 1453/2023 del 28/08/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA M5C2I2.3.1 ID Proposta 128 - ID Intervento 58. Costruzione nuovo polo infanzia Martiri della	Accordo Quadro Invitalia. DD approvazione progetto esecutivo e validazione n. 1432/2023 del 22/08/23, DD aggiudicazione n.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
	dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano								Libertà. Affidamento del servizio di ingegneria e architettura di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) a 26015 progetti S.r.l. S.t.P. e approvazione del nuovo quadro economico. (CUP: D13H20000010004 CIG: 9952878EBD)	2021/2022 del 06/11/23, ODA emesso in data 18/10/23, in attesa stipula contratto. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23 invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23. Importo complessivo su ReGiS corretto.
44	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità	D15F21000100005	Interventi presso ex area Frazzi - Forno piccolo - CUP: D15F21000100005	1.135.572,32 €	1.138.694,32 €	496.197,03 €	483.164,00 €	18.341,52 €	Determinazione dirigenziale 1832/2023 del 17/10/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 76 M5-C2-I2.3.1 DNSH Regime 2 - Ex Area Frazzi - Forno Piccolo - Laboratorio del cotto. Modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 1530 del 13 settembre 2023 di affidamento all'ing. Dorianò Soldati per il servizio di architettura e ingegneria	Accordo Quadro Invitalia. Ricevuto rapporto di verifica del progetto esecutivo, successiva restituzione modifiche. DD approvazione e validazione progetto esecutivo prevista entro il termine. Sottoscrizione ODA prevista per il 14/12/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23: invio

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
	e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano								relativo alla valutazione degli aspetti acustici ambientali e architettonici. (CUP: D15F21000100005 - CIG: A00BFF0521)	pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23. Importo complessivo 1.138.694,32 euro, da aggiornare in ReGIS.
45	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di	D15F21000110005	Interventi presso ex area Frazzi - Forno grande - CUP: D15F21000110005	1.316.154,72 €	1.985.248,37 €	1.080.773,60 €	803.844,00 €	39.871,48 €	Determinazione dirigenziale 1759/2023 del 11/10/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 56 M5-C2-I2.3.1 - DNSH Regime 2 Ex Area Frazzi - Forno Grande - Spazi Espositivi e Associazionismo. Modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 1518 dell'11 settembre 2023 di affidamento a ProACustica di Alessia Carrettini del servizio di architettura e ingegneria relativo alla valutazione degli aspetti acustici ambientali e architettonici. (CUP: D15F21000110005 - CIG: A00B495632)	Accordo Quadro Invitalia. Ricevuto il rapporto di verifica del progetto esecutivo intermedio, in corso la modifica del progetto al fine della restituzione. A seguito della validazione del progetto, redazione DD approvazione e validazione progetto esecutivo prevista entro il termine. Sottoscrizione ODA prevista per il 16/12/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23; invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
	modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano									relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23. Importo complessivo 1.985.248,37 euro, da aggiornare in ReGIS.
46	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della	D17H2100040005	Recupero e riqualificazione impianti sportivi - CUP: D17H2100040005	2.910.450,00 €	2.910.000,00 €	2.400.000,00 €	2.292.265,00 €	21.181,38 €	Determinazione dirigenziale 1845/2023 del 18/10/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 - Impianti sportivi comunali. Modifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n° 733 dell'8 maggio 2023 - Integrazione spesa da corrispondere all'ing. Giancarlo Fornasari per le prestazioni relative alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo e di Direzione Operativa delle strutture. (CUP: D17H21000400005 - CIG: 9336111286)	Accordo Quadro Invitalia. Ricevuto rapporto di verifica positivo per il progetto esecutivo, validazione in corso. DD approvazione e validazione progetto esecutivo prevista entro novembre 23. Sottoscrizione ODA prevista per il 30/11/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23: invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
	qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano									10/12/23. Importo complessivo 2.910.000 euro da aggiornare in ReGiS.
47	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e	D17H21000410005	Interventi sul verde - Parco Sartori- CUP: D17H21000410005	358.470,79 €	358.470,79 €	323.707,88 €	356.078,67 €	- €	Determinazione dirigenziale 1151/2023 del 10/07/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 82 M5-C2-I2.3.1 - DNSH Regime 2 Interventi sulla mobilità in Largo Moreni. Approvazione della spesa da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo relativo alla procedura d'appalto effettuata da Invitalia per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento. (CUP: D17H21000440005 - CIG: 91813100B3)	Contratto stipulato in data 20/10/23, consegna lavori il 02/10/23, esecuzione lavori in corso. Inviata pec al ministero con DD a contrarre + QE relazione RUP in data 05/10/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23: invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23.Importo complessivo in ReGiS corretto.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
	strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano									
48	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	D17H21000420005	Interventi sul verde - Parco Tognazzi - CUP: D17H21000420005	226.561,98 €	226.561,98 €	204.619,84 €	225.081,82 €	4.172,30 €	Determinazione dirigenziale 1151/2023 del 10/07/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 82 M5-C2-I2.3.1 - DNSH Regime 2 Interventi sulla mobilità in Largo Moreni. Approvazione della spesa da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo relativo alla procedura d'appalto effettuata da Invitalia per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento. (CUP: D17H21000440005 - CIG: 91813100B3)	Contratto stipulato in data 12/10/23, consegna lavori il 22/09/23, esecuzione lavori in corso. Inviata pec al ministero con DD a contrarre + QE relazione RUP in data 05/10/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23: invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23. Importo complessivo in ReGiS corretto .

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
49	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riquilificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	D17H21000440005	Interventi sulla viabilità in Largo Moreni - CUP: D17H21000440005	1.645.793,71 €	1.645.793,71 €	1.359.328,55 €	1.313.392,69 €	19,15 €	Determinazione dirigenziale 1151/2023 del 10/07/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 82 M5-C2-I2.3.1 - DNSH Regime 2 Interventi sulla mobilità in Largo Moreni. Approvazione della spesa da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo relativo alla procedura d'appalto effettuata da Invitalia per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento. (CUP: D17H21000440005 - CIG: 91813100B3)	Accordo Quadro Invitalia. Effettuata verifica del progetto e validazione del progetto da parte del RUP. Si prevede DD di approvazione e validazione del progetto entro il termine. Sottoscrizione ODA prevista per il 09/12/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23: invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23. Importo complessivo in ReGiS corretto .
50	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riquilificazione e incremento	D17H21000450005	Interventi sulla viabilità in via del Porto e Largo Marinali d'Italia - CUP: D17H21000450005	550.927,23 €	550.927,23 €	453.006,15 €	447.705,53 €	6,09 €	Determinazione dirigenziale 1150/2023 del 10/07/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 84 M5-C2-I2.3.1 - DNSH Regime 2 Interventi sulla viabilità in	Accordo Quadro Invitalia. Effettuata verifica del progetto e validazione del progetto da parte del RUP. Si prevede DD di approvazione e validazione del

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
	dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano								via del Porto e Largo Marinai d'Italia. Approvazione della spesa da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo relativo alla procedura d'appalto effettuata da Invitalia per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento. (CUP: D17H21000450005 - CIG: 91813100B3)	progetto entro il termine. Sottoscrizione ODA prevista per il 14/12/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell'01.08.23: invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23. Importo complessivo in ReGiS corretto .
51	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità	D17H21000470005	Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per risoluzione allagamenti di via Monviso - CUP: D17H21000470005	459.320,99 €	459.320,99 €	362.434,93 €	362.434,93 €	204,60 €	Determinazione dirigenziale 1154/2023 del 10/07/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 M5-C2-I2.3.1 - DNSH Regime 2 Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per risoluzione allagamenti in via Monviso. Approvazione della spesa da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo	Accorod Quadro Invitalia. In attesa parere positivo RFI. Elaborati progettuali inviati al verificatore e in corso modifiche. Approvazione e validazione progetto esecutivo entro il termine. Sottoscrizione ODA prevista per il 19/12/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23: invio pec al ministero con

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
	e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano								relativo alla procedura d'appalto effettuata da Invitalia per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento. (CUP: D17H21000470005 - CIG: 91813100B3)	DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23. Importo complessivo in ReGiS corretto.
52	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di	D18I21000090005	Recupero e riqualificazione alloggi ERP via Vecchia - CUP: D18I21000090005	1.424.507,06 €	1.424.507,06 €	1.122.307,20 €	828.355,72 €	48.279,38 €	Determinazione dirigenziale 1156/2023 del 10/07/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 57 M5-C2-I2.3.1 - DNSH Regime 2 Recupero e riqualificazione alloggi ERP di via Vecchia. Approvazione della spesa da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo relativo alla procedura d'appalto effettuata da Invitalia per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento. (CUP: D18I21000090005 - CIG: 9181303AE9	Accordo Quadro Invitalia. Revisione elaborati corretti dai verificatori e successiva approvazione e validazione progetto esecutivo entro novembre 23. Sottoscrizione ODA prevista per l'01/12/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23: invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23. Importo complessivo su ReGiS corretto.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
	modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano									
53	M5.C2.I 2.3.1 Social housing Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) Riquilificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti	D18I21000100005	Recupero e riqualificazione alloggi ERP via Val dipado - CUP: D18I21000100005	3.639.062,73 €	3.639.062,73 €	2.994.135,00 €	2.422.130,00 €	76.232,47 €	Determinazione dirigenziale 1155/2023 del 10/07/2023 OGGETTO PNRR - NextGenerationEU - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 59 M5-C2-I2.3.1 - DNSH Regime 2 Recupero e riqualificazione alloggi ERP di via Val dipado. Approvazione della spesa da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo relativo alla procedura d'appalto effettuata da Invitalia per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento. (CUP: D18I21000100005 - CIG: 9180895A38)	Accordo Quadro Invitalia. In attesa riscontro verificatore del progetto esecutivo prevista per il 29/11/23 e successiva approvazione e validazione progetto entro il 06/12/23. Sottoscrizione ODA prevista per il 07/12/23. Termine da Decreto MIT n. 23150 dell' 01.08.23: invio pec al ministero con DD approvazione progetto e validazione + QE relazione RUP entro il 11/10/23, proroga al 10/12/23. Importo complessivo ReGIS corretto (comprese azioni sociali riga 33)

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	TOT. PROGETTO REGIS	TOT PROGETTO RISCONTRO ISTRUTTORIO	TOT FINANZIAMENTI PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (ULTIMO ATTO IN PUBBLICAZIONE)	NOTE
	innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano									

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGiS

